


Prozessbeschreibung Bau- und Planprojekt



Gemeinde
SANDE

(Haushaltsgrundsätzegesetz - HGrg) § 16 Baumaßnahmen, größere Beschaffungen, größere Entwicklungsvorhaben

- (1) Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen für Baumaßnahmen dürfen **erst veranschlagt werden, wenn Pläne, Kostenermittlungen und Erläuterungen vorliegen, aus denen die Art der Ausführung, die Kosten der Baumaßnahme, des Grunderwerbs und der Einrichtungen sowie die vorgesehene Finanzierung und ein Zeitplan ersichtlich sind.** Den Unterlagen ist eine Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Haushaltsbelastungen beizufügen.

Gliederung

1. Leistungsphasen nach dem HOAI
2. Prozessbeschreibung Planprojekt
 - 2.1 Leistungsphase 1: Grundlagenermittlung
 - 2.2 Leistungsphase 2: Vorplanung
 - 2.3 Leistungsphase 3: Entwurfsplanung



Leistungsphasen nach der HOAI

(Honorarordnung für Architekten und Ingenieure §34)

- LP1: Grundlagenermittlung
- LP2: Vorplanung
- LP3: Entwurfsplanung
- LP4: Genehmigungsplanung
- LP5: Ausführungsplanung
- LP6: Vorbereitung der Vergabe
- LP7: Mitwirkung bei der Vergabe
- LP8: Objektüberwachung – Bauüberwachung und Dokumentation
- LP9: Objektbetreuung

Prozessbeschreibung Planprojekt

→ Anmeldung einer Maßnahme

Entscheidung
Planbeginn



Interne Abstimmung
des Projektes



Haushaltsplananmeldung
durch Maßnahmenliste
(Veranschlagung von
Planmitteln)

→ Meldung des Haushaltsplanansatzes


Leistungsphase 1 Grundlagenermittlung

Grundlagenermittlung
Leistungsphase 1 HOAI

- Machbarkeit prüfen
- Grundlagenermittlung

Nutzungsanforderungen
klären

Leistungsphase 2 Vorplanung

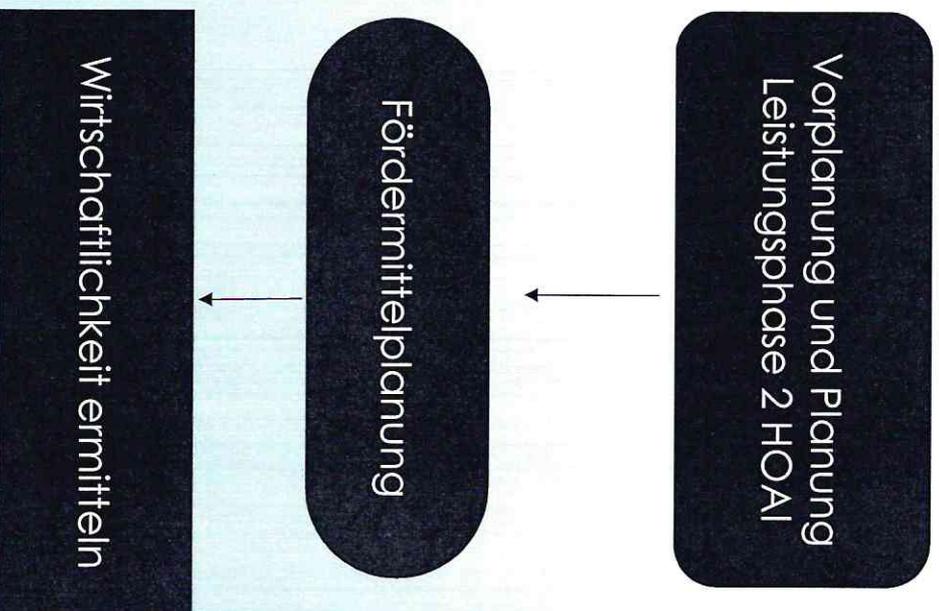


→ Es wird geprüft, welche Fördermittel in Frage kommen durch Fachbereich I

Leistungsphase 3 Entwurfsplanung


Entwurfsplanung
Leistungsphase 3 HOAI

→ Schätzung der Kosten

→ Festlegung eventueller Bauabschnitte

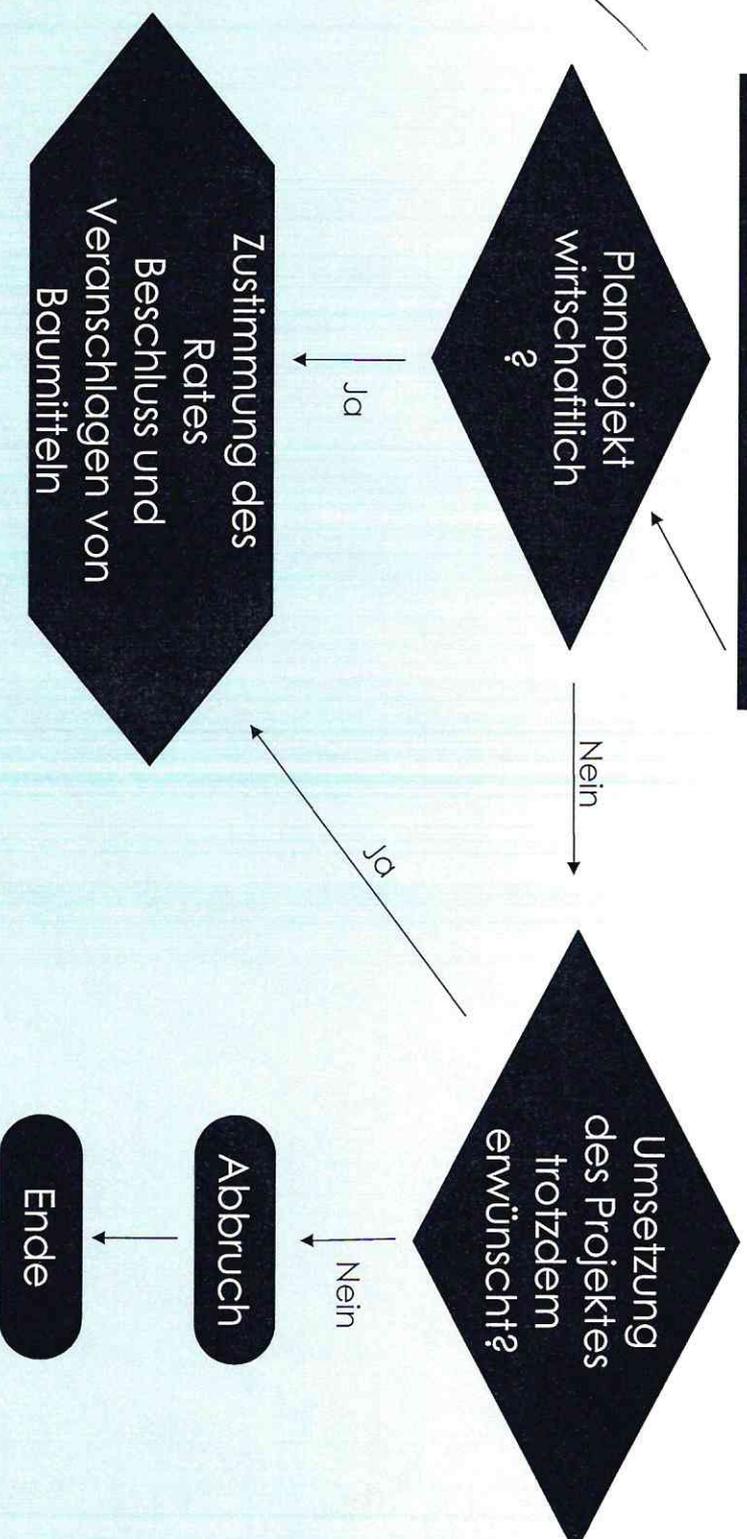

Vielen Dank!



**Gemeinde
SANDE**
